


Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	% voltooid	Notities	5 nov/dec	k1 '16 jan/feb/mrt	k2 '16 apr/mei/jun	k3 '16 jul/aug/sep	k4 '16 okt/nov/dec	k1 '17 jan/feb/mrt
1	Bestemmingsplanprocedure locatie Roelfsema	294,5 dagen	maa 14-12-15	vri 27-1-17	21%							
2	Voorontwerp BP	144,5 dagen	maa 14-12-15	vri 1-7-16	44%							
3	concept voorontwerp BP en beeldkwaliteitplan afronden	9 wkn	maa 14-12-15	vri 12-2-16	100%	incl. massastudie, gevelcontouren						
4	B&W-stukken maken en definitief maken	1 wk	maa 15-2-16	vri 19-2-16	100%							
5	aanleveren definitieve B&W + raad stukken	0 dagen	din 8-3-16	din 8-3-16	100%							
6	behandeling in B&W	0 dagen	din 15-3-16	din 15-3-16	100%							
7	<u>behandeling in raad</u>	0 dagen	din 5-4-16	din 5-4-16	0%	<i>besluit incl. coördinatieregeling en beeldkwaliteitplan</i>						
8	publicatie voorontwerp en BKP	1,7 wkn	din 5-4-16	vri 15-4-16	0%							
9	informele terinzage legging incl.toezending aan overlegpartners	6 wkn	vri 15-4-16	vri 27-5-16	0%	tijdens deze periode een inloopavond/info.bijeenkomst						
10	verwerken wijzigingen in het voorontwerp, aanvraag omgevingsvergunning afronden	4 wkn	vri 27-5-16	vri 24-6-16	0%							
11	B&W-stukken maken en definitief maken	1 wk	vri 24-6-16	vri 1-7-16	0%							
12	Ontwerp BP + omgevingsvergunning + hogere grenswaarde	87,5 dagen	din 5-7-16	don 3-11-16	0%							
13	aanleveren definitieve B&W stukken	0 dagen	din 5-7-16	din 5-7-16	0%							
14	behandeling in B&W	0 dagen	din 12-7-16	din 12-7-16	0%							
15	publicatie ontwerp BP en BKP + omg.vergunning + besluit hogere grenswaarde	1,5 wkn	din 12-7-16	don 21-7-16	0%							
16	formele terinzage legging + toezending aan overlegpartners (artikel 3.1.1. BRO)	10 wkn	don 21-7-16	don 29-9-16	0%	zomervakantieperiode van 16 juli t/m 28 augustus!! Terinzage periode met 4 weken verlengd						
17	verwerken zienswijzen + aanpassen ontwerp + evt. opstellen zienswijzennota	5 wkn	don 29-9-16	don 3-11-16	0%							
18	Vaststelling definitief BP + omgevingsvergunning + hogere grenswaarde	58,5 dagen	din 8-11-16	vri 27-1-17	0%							
19	aanleveren definitieve B&W + raad stukken	0 dagen	din 8-11-16	din 8-11-16	0%							
20	behandeling in B&W	0 dagen	din 15-11-16	din 15-11-16	0%							
21	<u>behandeling in raad</u>	0 dagen	din 6-12-16	din 6-12-16	0%							
22	publicatie vastgesteld BP	1,5 wkn	woe 7-12-16	vri 16-12-16	0%							
23	termijn van beroep bij RvS tegen vaststellingsbesluit	6 wkn	vri 16-12-16	vri 27-1-17	0%							
24	BP van kracht indien geen beroep bij Raad van State is ingesteld	0 dagen	vri 27-1-17	vri 27-1-17	0%							

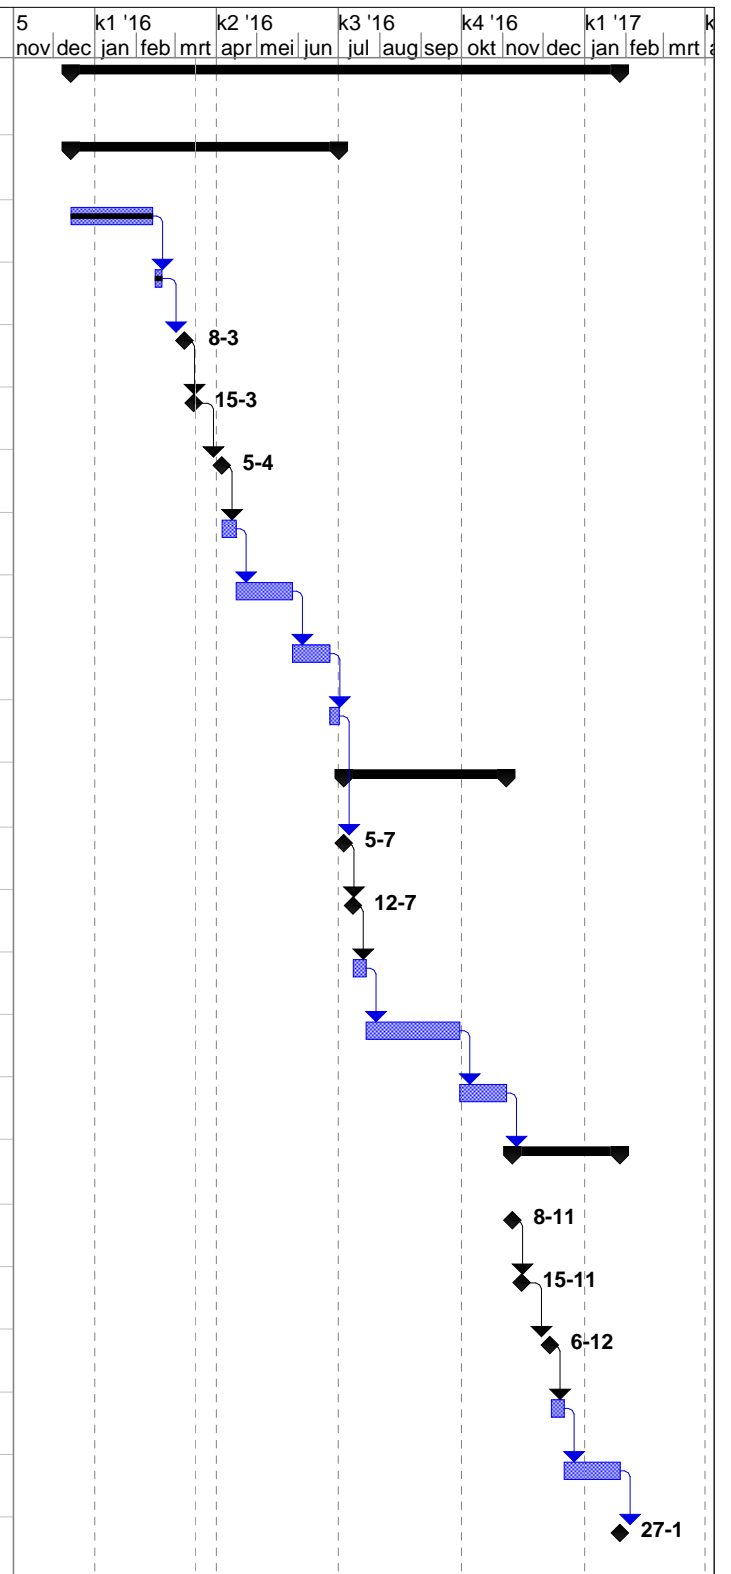

Project: 1600216_planning BP locatie Datum: woe 16-3-16	Taak		Projectsamenvatting		Inactieve samenvatting		Handmatige samenvatting		Externe mijlpaal	
	Splitsing		Splitsing		Handmatig taak		Alleen begindatum		Voortgang	
	Mijlpaal		Voortgang		Alleen duur		Alleen einddatum		Mijlpaal	
	Samenvatting		Inactieve mijlpaal		Handmatige samenvatting		Externe taken			
